



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES




CAPUFE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES

ANEXO

1

Calzada de los Reyes No. 24, Col. Tetela del Monte, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos.
Tel: 777 329 2100 www.gob.mx/capufe



MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA DE COBRO NO. 195 "AEROPUERTO LOS CABOS" KM 105+100, DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR"

Contrato: 4500033860



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



CAPUFE

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES

11 DE ABRIL DE 2024

1/10

**MODERNIZACION DE LA PLAZA DE COBRO NO. 195 "AEROPUERTO LOS CABOS"
 KM 105+100 DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR**



AVANCE FISICO - FINANCIERO AL 11 DE ABRIL DE 2024

SUPERVISION
 MECOPSSA MEXICANA DE CONSTRUCCION,
 PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V.

Contrato 4500033859 272 días
 INICIO 16 OCT 23
 TERMINO 13 JUL 24 Inversión 9.6 MDP

META FÍSICA
 UNA PLAZA DE COBRO No. de Estimaciones: 6
 Fecha:31/Mar/2024.

Avance Físico
 Prog: 63.76% Ejec: 63.76%

Avance Financiero
 Prog: 6.17 MDP Est: 6.17 MDP

CONTRATISTA
 GRUPO CONSTRUCTOR DE GEO S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION
 CONJUNTA CON RACCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V E ISLA,
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato 4500033860 272 días
 INICIO 01 NOV 23
 TERMINO 29 JUN 24 Inversión 261.9 MDP

META FÍSICA
 UNA PLAZA DE COBRO No. de Estimaciones: 10
 Fecha:31/Mar/2024.

Avance Físico
 Prog: 29.76% Ejec 33.85%


Avance Financiero
 Prog: 77.97 MDP Est: 88.67 MDP


**MODERNIZACION DE LA PLAZA DE COBRO NO. 195 "AEROPUERTO LOS CABOS"
 KM 105+100 DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR**



GRAFICA FISICO - FINANCIERO AL 11 DE ABRIL DE 2024

FECHA	AVANCE EJECUTADO	AVANCE PROGRAMADO
15 NOV	\$ 1,070,319.54	\$ 9,151,921.05
30 NOV	\$ 15,363,533.05	\$ 12,398,668.10
15 DIC	\$ 26,927,973.63	\$ 14,539,700.47
31 DIC	\$ 36,545,751.84	\$ 16,558,893.08
15 ENE	\$ 48,034,210.82	\$ 20,000,008.23
31 ENE	\$ 53,748,352.94	\$ 25,732,301.79
15 FEB	\$ 69,897,139.36	\$ 30,100,070.62
29 FEB	\$ 75,674,953.62	\$ 39,629,402.10
15 MAR	\$ 80,674,953.62	\$ 68,579,578.57
31 MAR	\$ 88,674,953.62	\$ 77,972,688.81
15 ABR	\$ -	\$ 81,349,391.54
30 ABR	\$ -	\$ 135,575,468.69
15 MAY	\$ -	\$ 155,723,767.20
31 MAY	\$ -	\$ 180,245,779.31
15 JUN	\$ -	\$ 217,856,596.50
29 JUN	\$ -	\$ 261,992,357.66

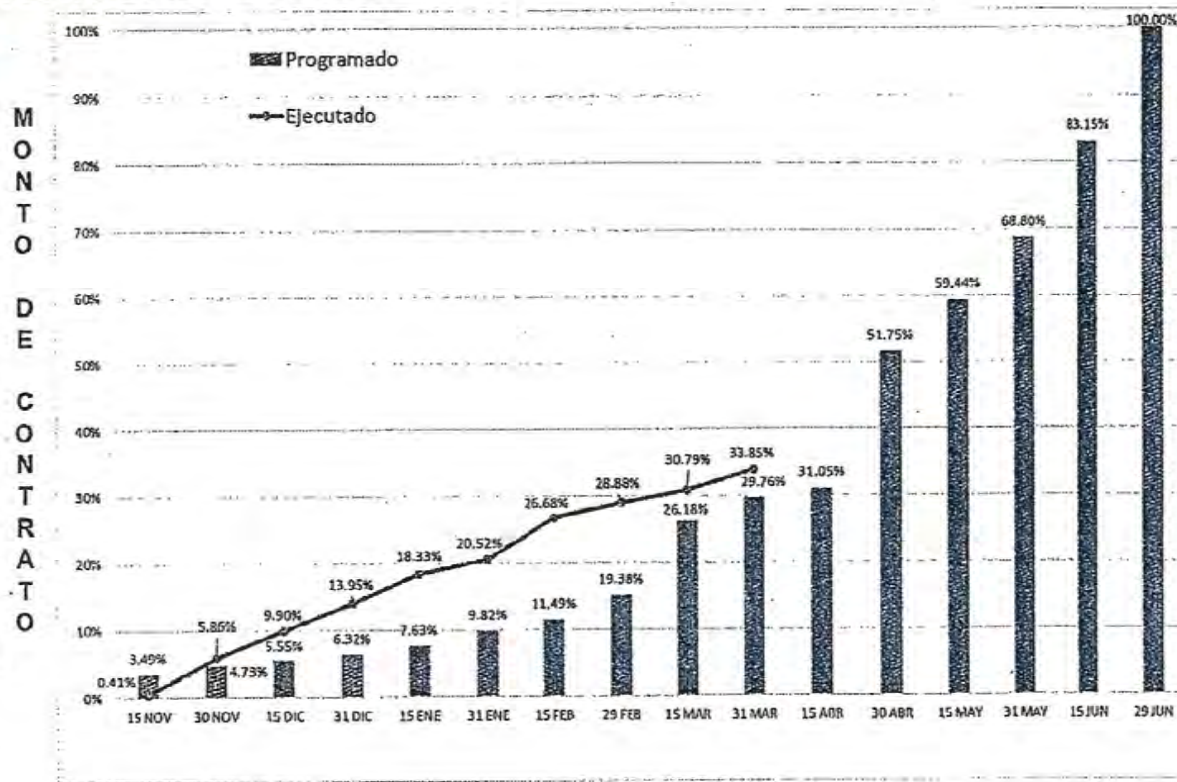

 Monto del contrato
 261.99 MDP

MODERNIZACION DE LA PLAZA DE COBRO NO. 195 "AEROPUERTO LOS CABOS" KM 105+100 DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR



LINEA DEL TIEMPO

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON RACCO, S.A. DE C.V. E ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CONTRATO: 4500033860
 MONTO: 261.99 MDP sin IVA
 ANTICIPO: 52.39 MDP sin IVA
 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE ACUERDO A LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA: 17.53

UNIDAD REGIONAL:	FECHA:
MAZATLÁN	16-abr-24

OBRA: MODERNIZACION DE LA PLAZA DE COBRO NO. 195 "AEROPUERTO LOS CABOS" KM 105+100, DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2023				2024											
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO						
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 242 DÍAS															
	01-nov-23															
PROGRAMA LICITACIÓN	9.15	3.75	2.14	2.02	3.44	5.73	4.37	20.68	17.80	9.39	3.38	54.23	20.15	24.52	37.81	44.14
	9.15	12.40	14.54	16.56	20.00	25.73	30.10	50.78	68.58	77.97	81.35	135.53	155.73	180.25	217.86	261.99
ESTIMACIONES	1.07	14.29	10.56	10.62	11.49	5.71	16.15	5.78	5.00	7.00						
	1.07	15.36	25.93	36.55	48.03	53.75	69.90	75.67	80.67	88.67						

	2023				2024											
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO						
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA 272 DÍAS															
	15/10/2023															
PROGRAMA LICITACIÓN	0.44	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.17					
	0.44	1.59	2.73	3.88	5.03	6.18	7.32	8.47	9.62	10.77	11.92	13.07	14.22	15.37	16.52	17.67
ESTIMACIONES	0.44	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15						
	0.44	1.59	2.74	3.89	5.04	6.19	7.34	8.49	9.64	10.79	11.94	13.09	14.24	15.39	16.54	17.69

MODERNIZACION DE LA PLAZA DE COBRO NO. 195 "AEROPUERTO LOS CABOS" KM 105+100 DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR




VISTA AEREA DE LA PLAZA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN



MODERNIZACION DE LA PLAZA DE COBRO NO. 195 "AEROPUERTO LOS CABOS" KM 105+100 DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR




VISTA AEREA DE LA PLAZA AL 11 DE ABRIL DE 2024

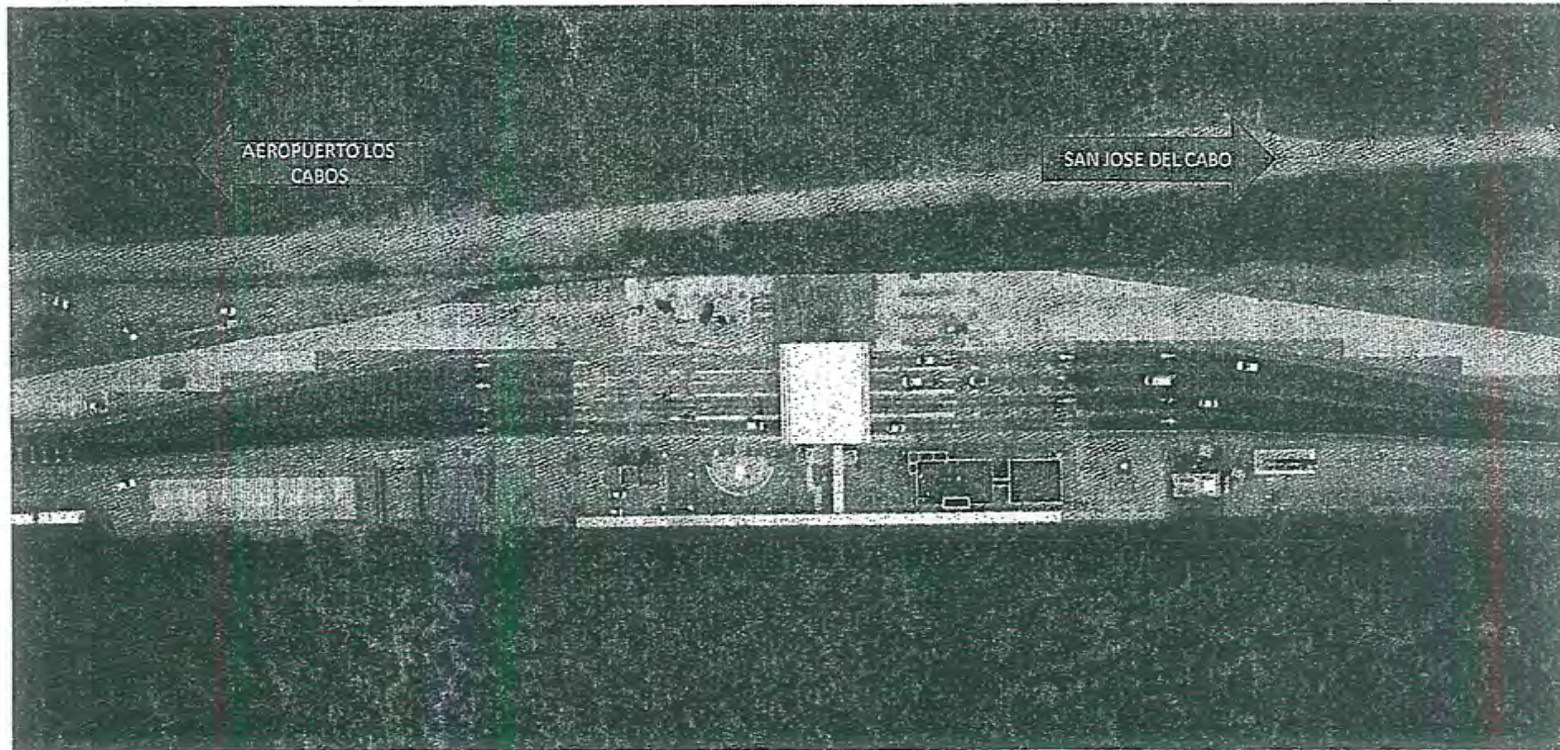

MODERNIZACION DE LA PLAZA DE COBRO NO. 195 "AEROPUERTO LOS CABOS" KM 105+100 DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR




RELLENO DE CIMENTACION DE TECHUMBRE EN LA ZONA DE AMPLIACION

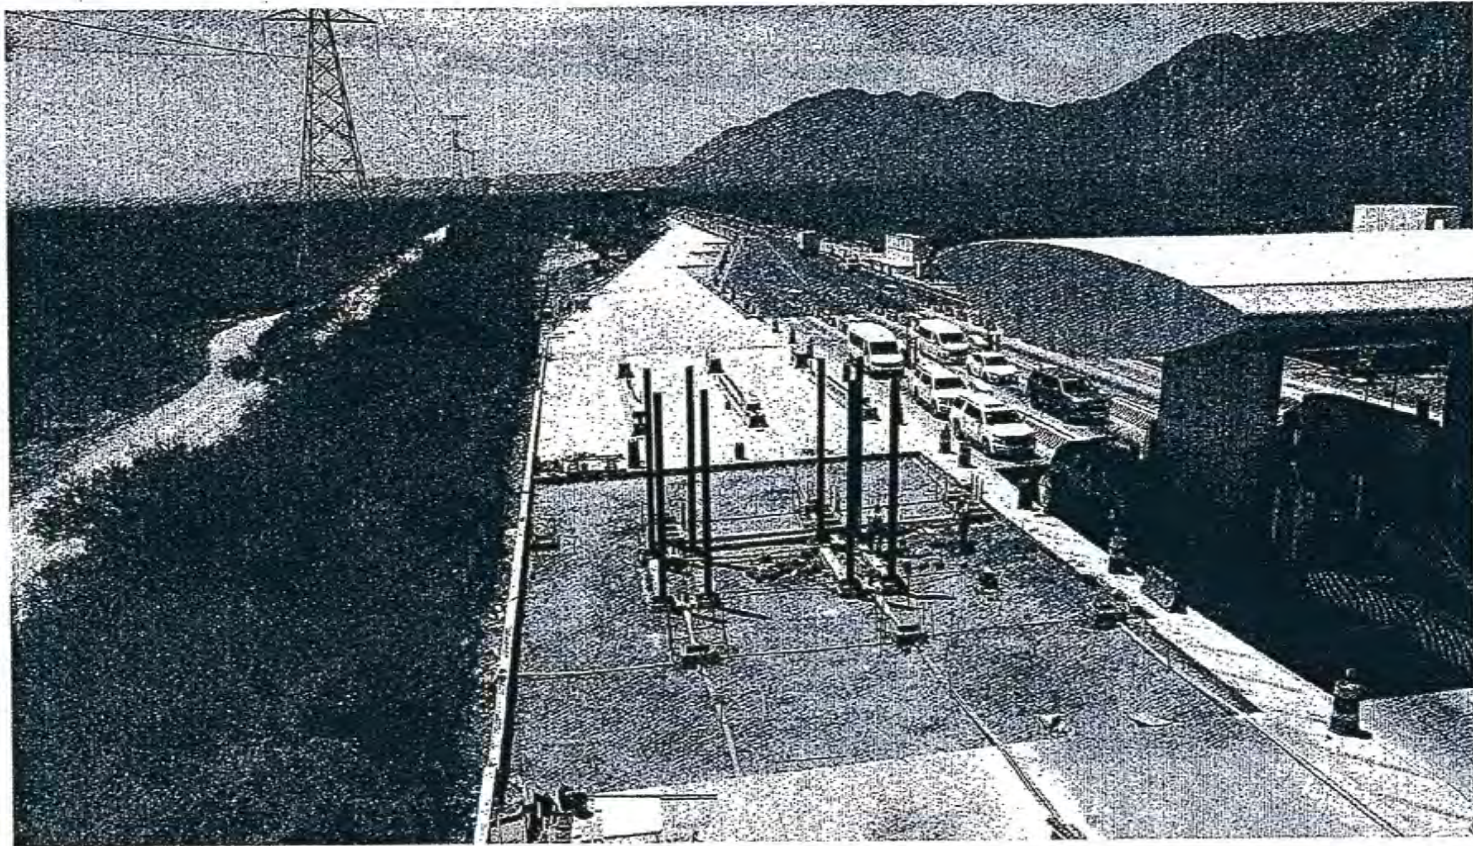

MODERNIZACION DE LA PLAZA DE COBRO NO. 195 "AEROPUERTO LOS CABOS" KM 105+100 DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR




TRABAJOS EN TECHUMBRE GRANJA SOLAR

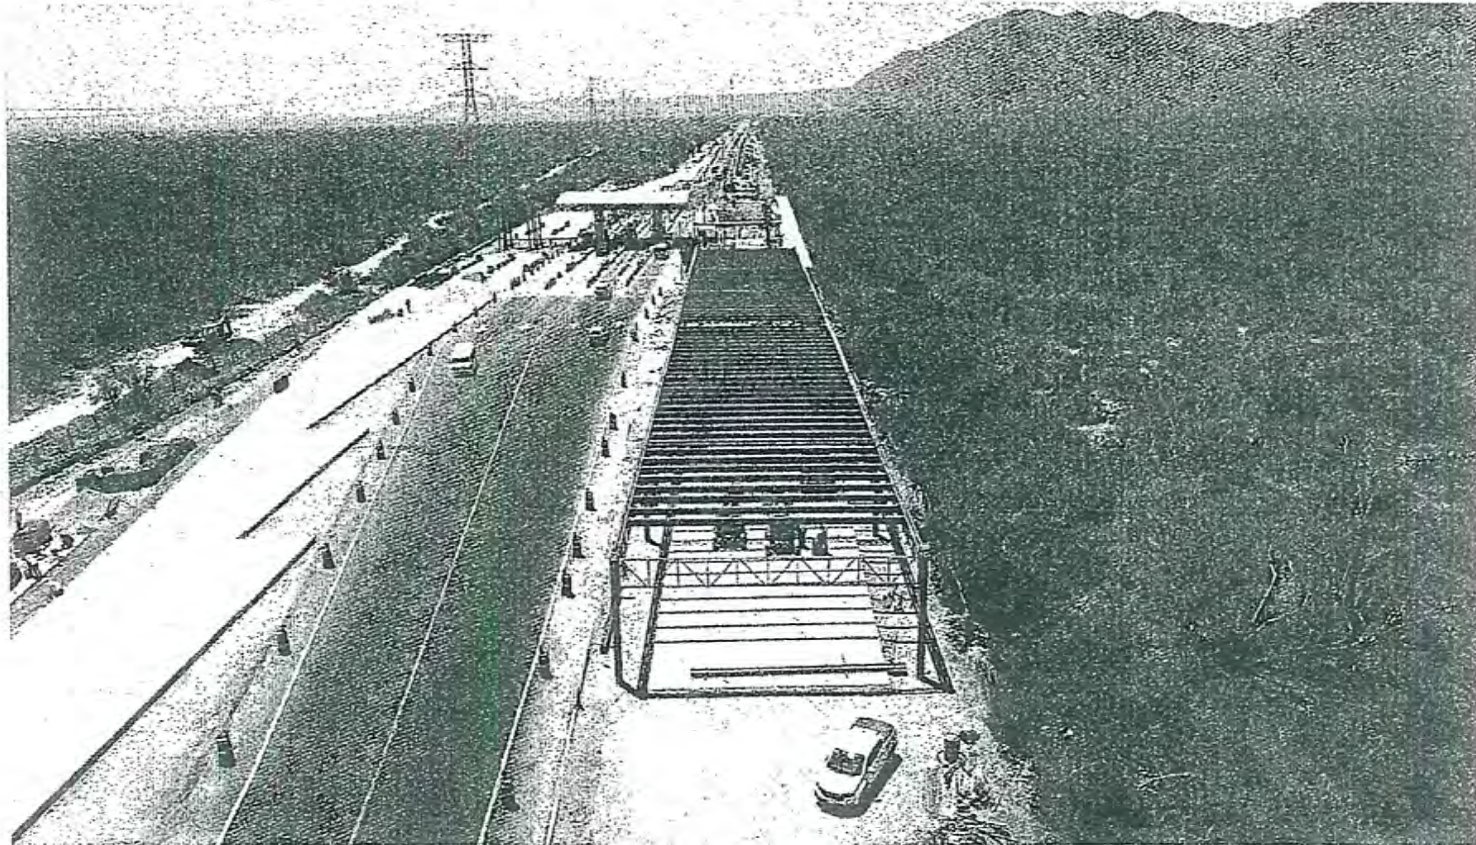

MODERNIZACION DE LA PLAZA DE COBRO NO. 195 "AEROPUERTO LOS CABOS" KM
105+100 DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR



TECHUMBRE PARA GRANJA SOLAR

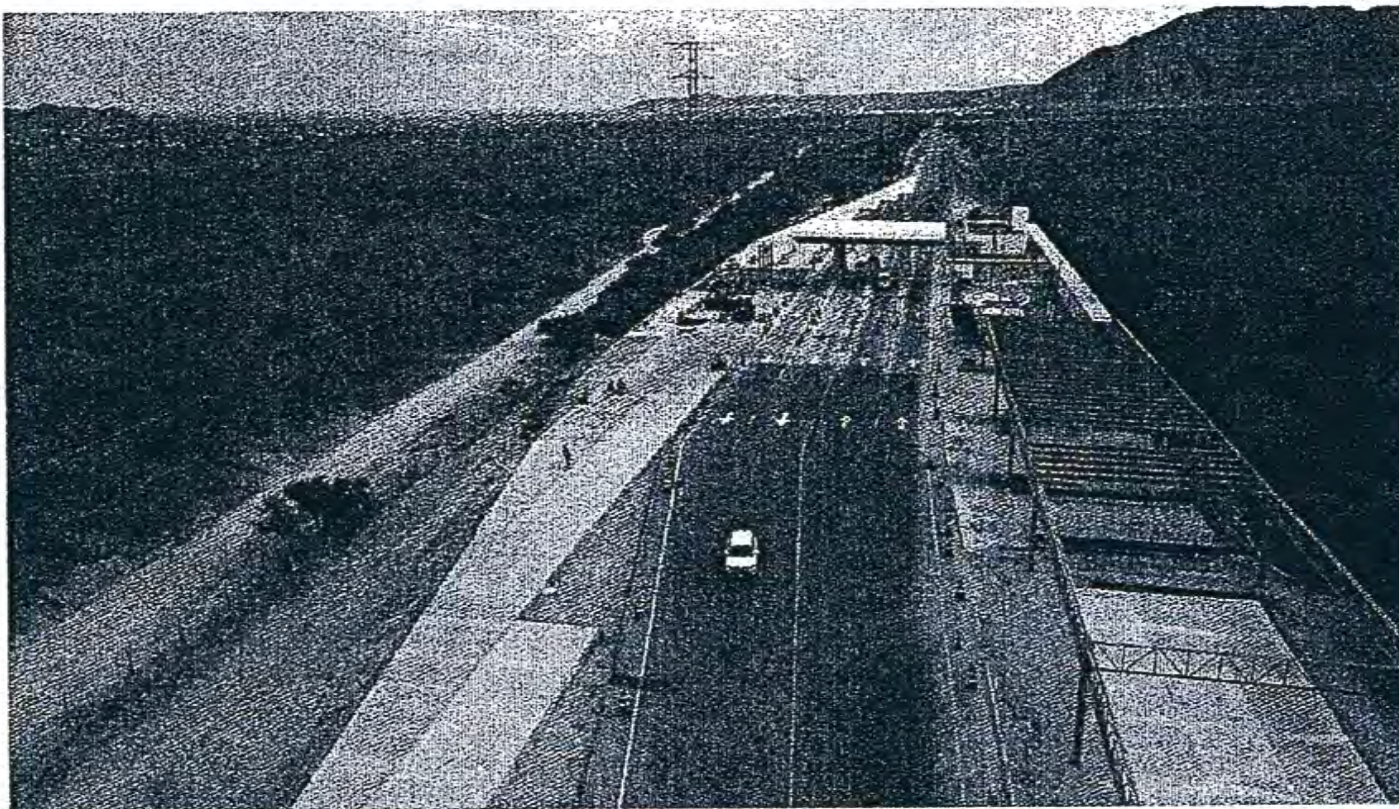

MODERNIZACION DE LA PLAZA DE COBRO NO. 195 "AEROPUERTO LOS CABOS" KM 105+100 DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR



CONCRETO EN TECHUMBRE GRANJA SOLAR

